




Faurbo Vandværk

Månedssrapport 08-2016

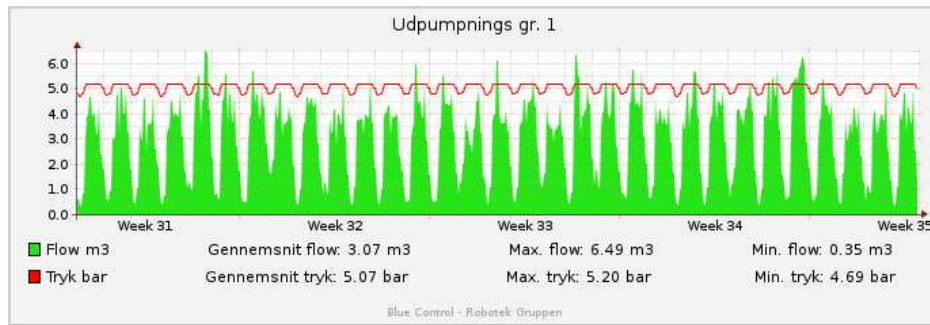

Mængder

Udpumpet vandmængde:	Total: 2.290,8 m³	Måler 1: 2.290,8 m³
Indvundet vandmængde:	Total: 1.843,3 m³	Måler 2: 1.843,3 m³

Forbrug

Elforbrug:	Total: 2.378,0 kWh	Udpumpet: 880,9 kWh
	Total: 1,04 kWh/m³	Udpumpet: 0,38 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m³/h	Tidspunkt: 01-08-16 00:00:03
Max. Flow:	12,35 m³/h	Tidspunkt: 20-08-16 03:23:39

Flow måler 2:

Min. Flow:	0,00 m³/h	Tidspunkt: 01-08-16 00:00:00
Max. Flow:	8,43 m³/h	Tidspunkt: 27-08-16 18:05:19

Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau:	Højest: -48,15 m	Lavest: -51,59 m	Sænkning: 3,43 m
Boring 2 niveau:	Højest: -48,71 m	Lavest: -53,26 m	Sænkning: 4,54 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl: 6
Filter 2:	Antal skyl: 6

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	111 Timer	2200 Timer
Boring 2:	241 Timer	3701 Timer
Pumpe 1:	359 Timer	8829 Timer
Pumpe 2:	376 Timer	8828 Timer
