

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Maj 2026

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2425,73 m ³
Boring 1	1216,57 m ³
Boring 2	1209,16 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2394,48 m ³
Udpumpning	2394,48 m ³
ANDET	7,51 m ³
Skyllevand	7,51 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	916 kWh
Pumpe 1	395 kWh
Pumpe 2	521 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

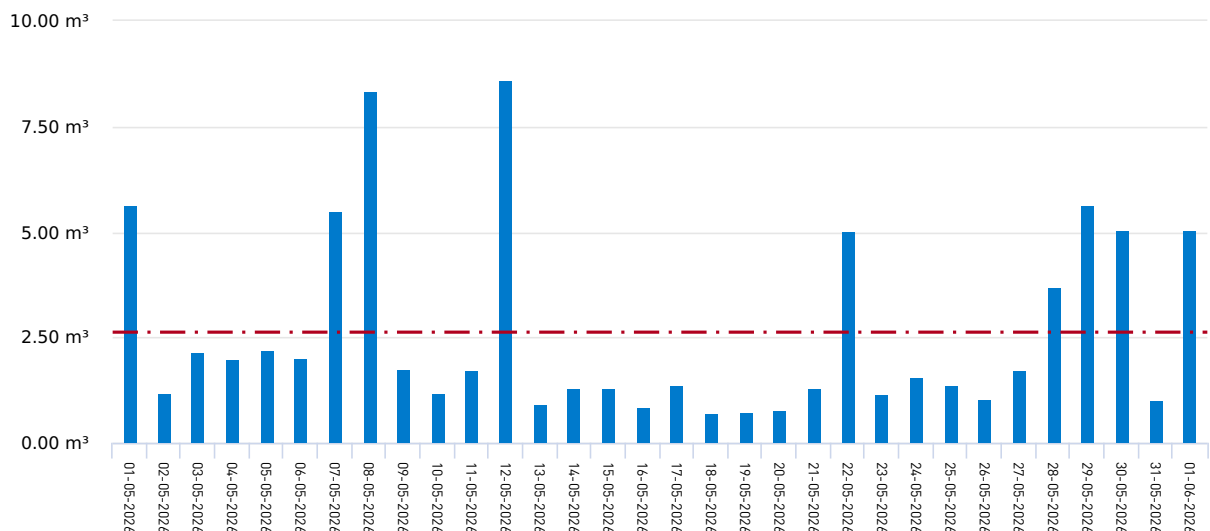

FILTRE

FILTERSKYL	21
Filter 1	6
Filter 2	5
Filter 3	5
Filter 4	5

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,30 m ³
	13-05-26 03:00->04:00
Maximum	9,67 m ³
	05-05-26 05:00->06:00
Gennemsnit	3,22 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,61 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2026

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING



● Boring 1	6d 20t 20m
● Boring 2	6d 19t 24m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 07t 53m
● Pumpe 2	18d 20t 16m

ANDET

● Beluftning	13d 12t 15m
● Skylleluft	00t 44m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,28 m	-53,42 m	4,14 m
Boring 2	-49,13 m	-53,23 m	4,10 m



TÆLLERSTAND

31-05-2026 23:59:59

Boring 1	107564 m³
Boring 2	99833 m³
Udpumpning	127227 m³
Skyllevand	197597 m³



Blue Control®
BC7000
