

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2026

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1574,08 m ³
Boring 1	785,11 m ³
Boring 2	788,97 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1534,44 m ³
Udpumpning	1534,44 m ³
ANDET	4,94 m ³
Skyllevand	4,94 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	680 kWh
Pumpe 1	338 kWh
Pumpe 2	342 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

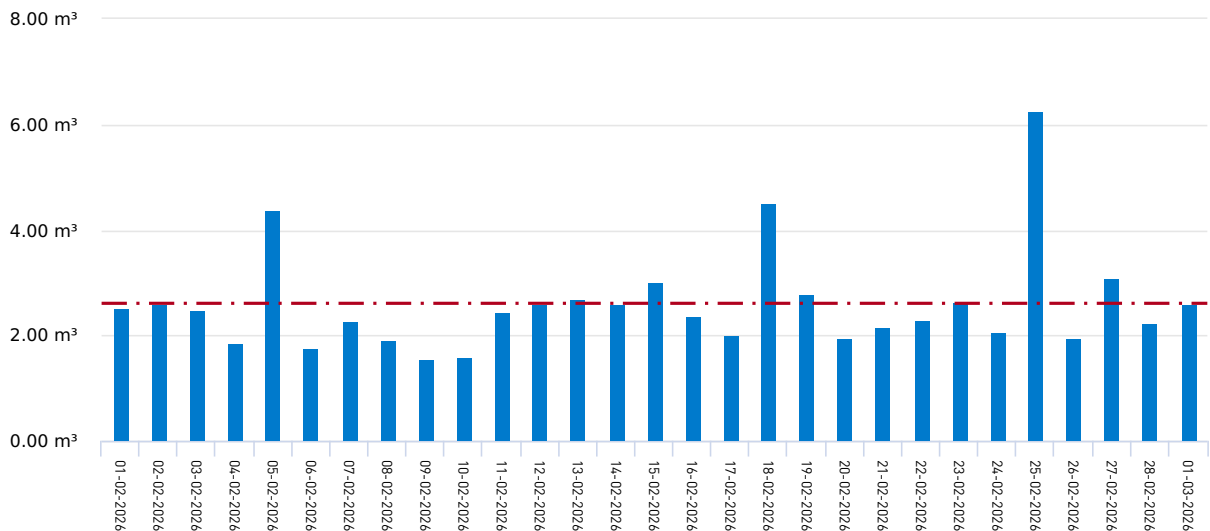

FILTRE

FILTERSKYL	15
Filter 1	3
Filter 2	4
Filter 3	4
Filter 4	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,45 m ³
	01-02-26 04:00->05:00
Maximum	5,38 m ³
	04-02-26 05:00->06:00
Gennemsnit	2,28 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,26 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Februar 2026

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 1	4d 07t 32m
● Boring 2	4d 08t 11m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	14d 00t 00m
● Pumpe 2	13d 23t 55m

ANDET

● Beluftning	8d 15t 57m
● Skylleluft	00t 28m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,23 m	-53,37 m	4,14 m
Boring 2	-49,12 m	-53,20 m	4,08 m



TÆLLERSTAND

28-02-2026 23:59:59

Boring 1	104298 m³
Boring 2	96579 m³
Udpumpning	120812 m³
Skyllevand	197578 m³



Blue Control®
BC7000
