

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2025

Faurbo Vandværk

1/2



## MÆNGDE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TOTAL INDVINDING | 2029,61 m <sup>3</sup> |
| Boring 1         | 1012,62 m <sup>3</sup> |
| Boring 2         | 1016,99 m <sup>3</sup> |
| TOTAL UDPUMPNING | 1982,95 m <sup>3</sup> |
| Udpumpning       | 1982,95 m <sup>3</sup> |
| ANDET            | 7,17 m <sup>3</sup>    |
| Skyllevand       | 7,17 m <sup>3</sup>    |

## KWH FORBRUG




|            |           |
|------------|-----------|
| UDPUMPNING | 65990 kWh |
| Pumpe 1    | 49990 kWh |
| Pumpe 2    | 16000 kWh |



## NATFORBRUG UDPUMPNING

### UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

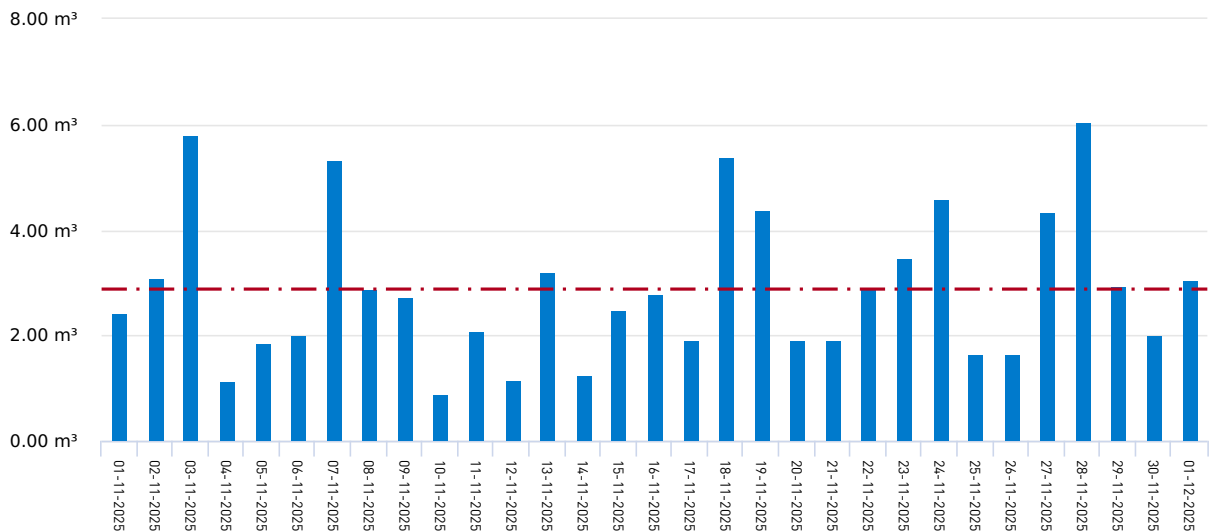

## FILTRE

|            |    |
|------------|----|
| FILTERSKYL | 20 |
| Filter 1   | 5  |
| Filter 2   | 5  |
| Filter 3   | 5  |
| Filter 4   | 5  |

## NØGLETAL



### FLOWMÅLER

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Minimum    | 0,30 m <sup>3</sup>    |
|            | 05-11-25 03:00->04:00  |
| Maximum    | 7,82 m <sup>3</sup>    |
|            | 06-11-25 10:00->11:00  |
| Gennemsnit | 2,75 m <sup>3</sup> /h |

### EFFEKTIVITET

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| kWh-forbrug | 0,03 m <sup>3</sup> /kWh |
|-------------|--------------------------|



Blue Control®  
BC7000

# DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport November 2025

Faurbo Vandværk

2/2



## DRIFTTIMER

### INDVINDING



|            |            |
|------------|------------|
| ● Boring 1 | 5d 12t 56m |
| ● Boring 2 | 5d 13t 30m |

### UDPUMPNING

|           |             |
|-----------|-------------|
| ● Pumpe 1 | 14d 23t 52m |
| ● Pumpe 2 | 15d 12t 38m |

### ANDET

|              |             |
|--------------|-------------|
| ● Beluftning | 10d 22t 55m |
| ● Skylleluft | 00t 40m     |



## NIVEAUER I BORINGER

| BORING   | HØJEST   | LAVEST   | SÆNKNING |
|----------|----------|----------|----------|
| Boring 1 | -49,40 m | -53,63 m | 4,23 m   |
| Boring 2 | -49,31 m | -53,40 m | 4,09 m   |



## TÆLLERSTAND

30-11-2025 23:59:59

|            |           |
|------------|-----------|
| Boring 1   | 101662 m³ |
| Boring 2   | 93875 m³  |
| Udpumpning | 115594 m³ |
| Skyllevand | 197561 m³ |



Blue Control®  
BC7000
