

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juni 2026

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2451,50 m ³
Boring 1	1249,20 m ³
Boring 2	1202,30 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2436,95 m ³
Udpumpning	2436,95 m ³
ANDET	7,32 m ³
Skyllevand	7,32 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	25511 kWh
Pumpe 1	12790 kWh
Pumpe 2	12721 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

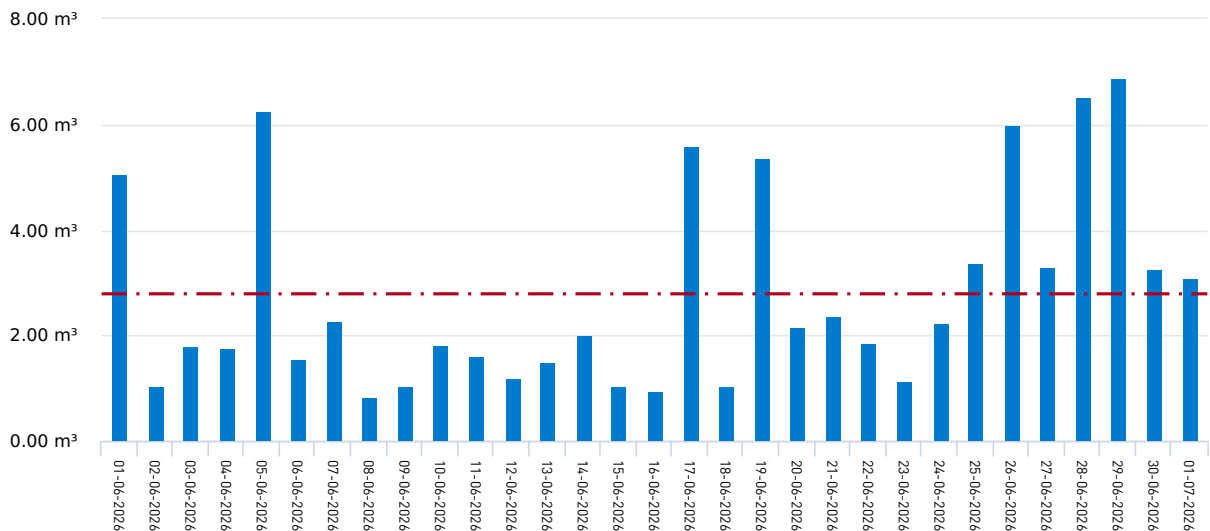

FILTRE

FILTERSKYL	23
Filter 1	5
Filter 2	6
Filter 3	6
Filter 4	6

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,40 m ³
	08-06-26 02:00->03:00
Maximum	9,33 m ³
	27-06-26 02:00->03:00
Gennemsnit	3,39 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	0,10 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juni 2026

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING


● Boring 1	7d 07t 02m
● Boring 2	7d 00t 26m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 12t 09m
● Pumpe 2	15d 15t 49m

ANDET

● Beluftning	14d 04t 19m
● Skylleluft	00t 44m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,52 m	-53,77 m	4,25 m
Boring 2	-49,36 m	-53,56 m	4,20 m



TÆLLERSTAND

30-06-2026 23:59:59

Boring 1	108813 m³
Boring 2	101036 m³
Udpumpning	129664 m³
Skyllevand	197604 m³



Blue Control®
BC7000
