

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Oktober 2025

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2085,72 m ³
Boring 1	1041,75 m ³
Boring 2	1043,97 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2043,96 m ³
Udpumpning	2043,96 m ³
ANDET	5,53 m ³
Skyllevand	5,53 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	812 kWh
Pumpe 1	405 kWh
Pumpe 2	407 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

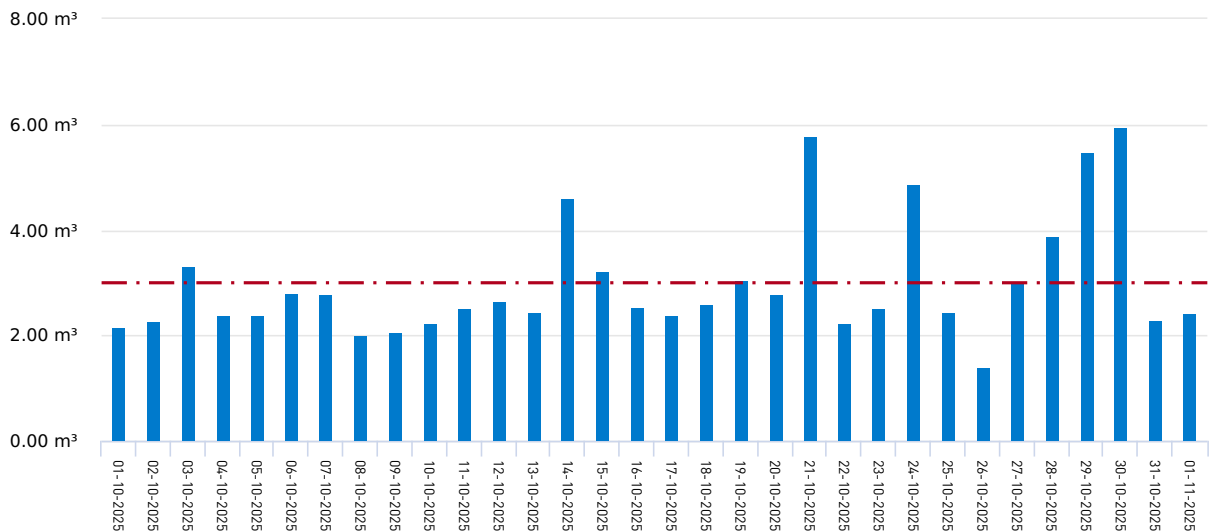

FILTRE

FILTERSKYL	16
Filter 1	4
Filter 2	4
Filter 3	4
Filter 4	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,45 m ³
	19-10-25 04:00->05:00
Maximum	7,45 m ³
	13-10-25 11:00->12:00
Gennemsnit	2,75 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,52 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Oktober 2025

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING



● Boring 1	5d 15t 12m
● Boring 2	5d 15t 22m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 21t 57m
● Pumpe 2	15d 15t 02m

ANDET

● Beluftning	11d 07t 02m
● Skylleluft	00t 32m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,34 m	-53,72 m	4,38 m
Boring 2	-49,28 m	-53,49 m	4,21 m



TÆLLERSTAND

31-10-2025 23:59:59

Boring 1	100649 m³
Boring 2	92858 m³
Udpumpning	113611 m³
Skyllevand	197554 m³



Blue Control®
BC7000
